



Exemple d'arbre à problème

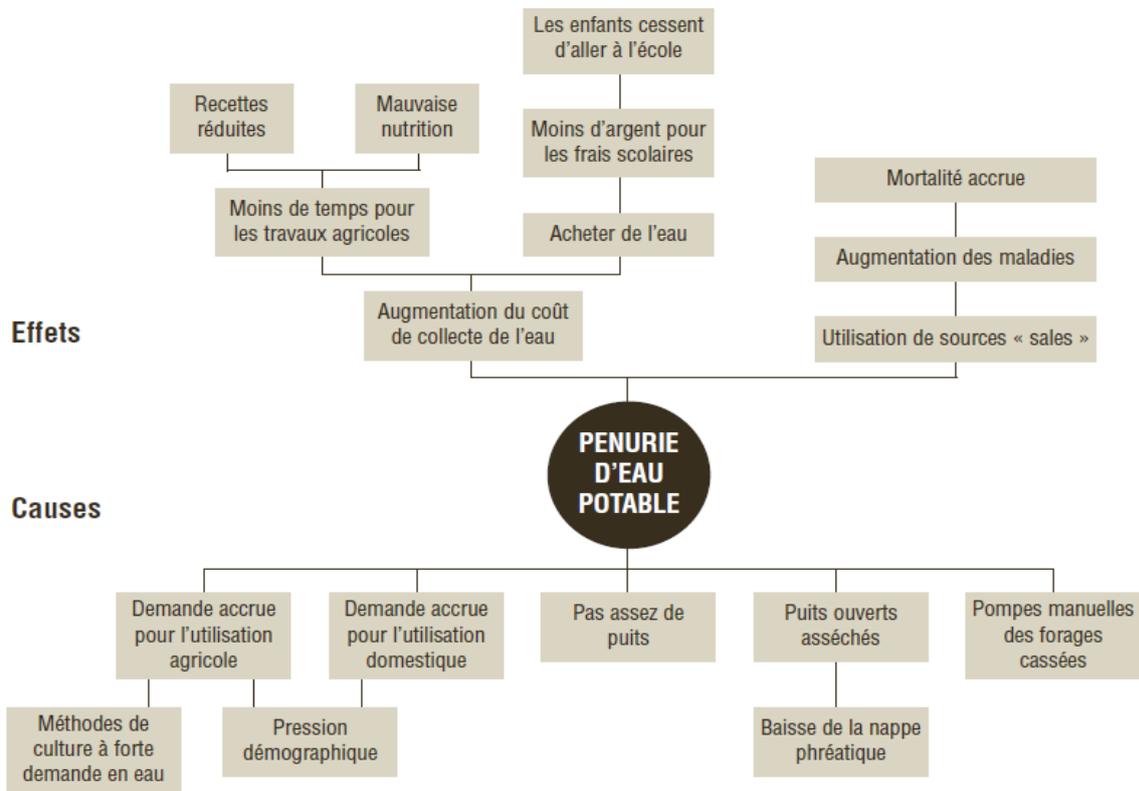

Exemple d'arbre à objectif

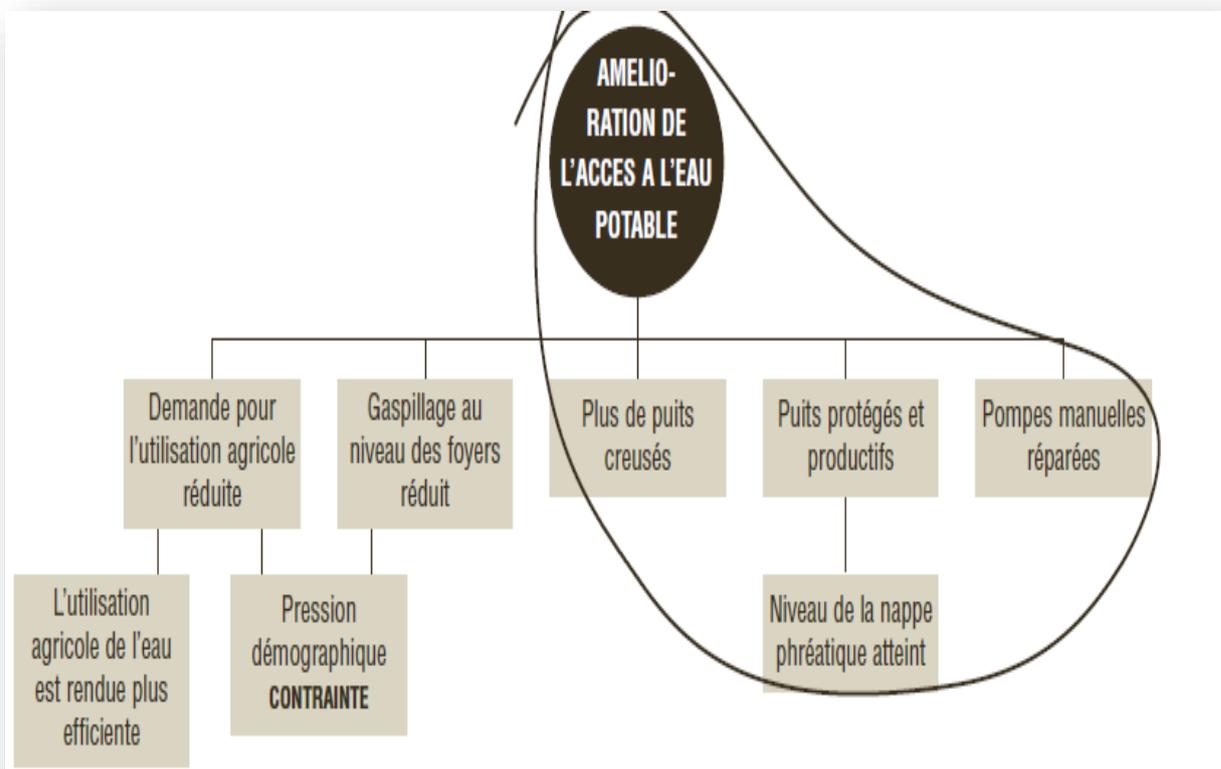

Exemple de cadre logique :

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses importantes
Objectifs de développement objectifs globaux	<ul style="list-style-type: none"> · Amélioration de la santé du groupe cible · Diminution des coûts pour la santé 	Diminution de 20% des cas de diarrhée, gale, maladies oculaires, paludisme, parasites (bilharzie) et malnutrition	Rapports de centres médicaux dans la zone du projet	
Objectif du projet / Objectif spécifique	Augmentation de la consommation d'eau pure de x à y et de l'utilisation de latrines de a à b	Création de xx points d'eau et de xx latrines et enregistrement de leur utilisation	Rapports semestriels du projet	Aucune pollution des ressources en eau. Poursuite des soins de santé primaire et de la formation
Résultats	<p>1. 50% du groupe cible dispose d'eau pure en quantité suffisante</p> <p>.....</p> <p>2. 50% des points d'eau existant dans la zone du projet sont réparés</p> <p>.....</p> <p>3. Les services d'entretien et de réparations sont opérationnels</p> <p>.....</p> <p>4. 20% des foyers dans la zone du projet disposent de latrines</p> <p>.....</p> <p>5. Les habitudes d'hygiène du groupe cible sont améliorées</p>	<p>Les points d'eau sont mis en route La qualité de l'eau est testée</p> <p>.....</p> <p>50% des points d'eau existant fonctionnent</p> <p>.....</p> <p>Tous les points d'eau figurent sur le schéma d'entretien</p> <p>.....</p> <p>Les latrines sont construites et utilisées correctement</p> <p>.....</p> <p>Les habitudes du groupe cible sont plus hygiéniques</p>	<p>Après la fin des installations visites de chantiers des personnels attachés au projet</p> <p>Rapports semestriels du projet</p> <p>Rapports du District Development Fund</p> <p>Rapports du Conseil de District</p> <p>.....</p> <p>Rapports semestriels du Ministère de la Santé</p> <p>.....</p> <p>Tests effectués auprès du groupe cible recevant une formation en matière d'hygiène</p>	<p>Le système d'entretien va continuer de fonctionner</p> <p>Mesures à prendre : établir un budget pour les dépenses courantes par les autorités de la santé</p> <p>.....</p> <p>Le groupe cible est prêt à accepter de nouvelles habitudes dans les domaines de l'eau et de l'hygiène</p> <p>Mesures à prendre : des méthodes permettant une participation active du groupe cible</p>

Activités	1.1 Former xx personnels 1.2 Choisir xx sites pour les points d'eau 1.3 Lancer un appel d'offres pour se procurer le matériel 1.4 Forer et construire xx puits 2.1 Former xx "groupes de l'eau" 2.2 Acquérir le matériel 2.3 Réparer xx vieux points d'eau 3.1 Créer une organisation chargée de l'entretien 3.2 Établir des mécanismes de couverture des coûts 4.1 Acquérir le matériel 4.2 Former xx ouvriers maçons 4.3 Identifier le groupe cible 4.4 Construire les latrines 5.1 Recenser les habitudes d'hygiène existantes 5.2 Vulgarisation de l'hygiène	Le projet et ses coûts Financement suédois Capital technique Frais de fonctionnement Infrastructure Assistance Technique (4 techniciens) en SEK Coût total district 1 20.685.000 Coût total district 2 22.015.000 Total des coûts suédois 42.700.000 Financement local Personnel (unité à l'autorité sanitaire locale) Infrastructure Entretien Frais de fonctionnement en monnaie locale Coût total district 1 15.500.000 Coût total district 2 19.800.000 Total des coûts en monnaie locale 35.300.00 Total des coûts en SEK 22.062.500 Total des coûts pour la Suède et pour le pays bénéficiaire en SEK 64.762.500	Existence des intrants, du matériel et des personnels nécessaires Mesure à prendre : effectuer une étude - Le groupe cible va coopérer Mesure à prendre : le groupe cible participe à la planification, à la mise en œuvre et au suivi - L'organisation responsable de la mise en œuvre remplit ses engagements Mesure à prendre : les autorités sanitaires signent un accord	
Moyens / Intrants			Conditions préalables	1. La nappe phréatique est suffisante et de bonne qualité 2. Le gouvernement poursuit son assistance au projet

Exemple d'indicateur objectivement vérifiable

Un exemple d'indicateurs

Objectif: Accès amélioré aux marchés ruraux/régionaux

Choisir l'indicateur: Durée moyenne du trajet jusqu'au marché le plus proche

Définir les cibles:

- **Définir la quantité:** La durée moyenne du trajet jusqu'au marché le plus proche est réduite de 25 % par rapport à celle de l'année x ...
- **Définir la qualité:** ... durant la saison des pluies ...
- **Déterminer le groupe cible:** ... , pour tous les voyageurs, femmes et hommes, disposant d'un véhicule privé ...
- **Définir la localisation :** ... dans la région de la Montagne Bleue ...
- **Déterminer la période:** ... et ce, 5 ans après le démarrage du projet

Exemple de chronogramme

Chronogramme type

Activités	Année 1											
	J	F	M	A	M	J	Ju	A	S	O	N	D
Activité 1	X	X										
Activité 2			X									
Activité 3				X	X	X	X	X				
Activité 4								X	X	X	X	X

Exemple de budget

Voir autre fichier pdf dans les annexes documentaires
